

大洲市橋梁個別施設計画



※ 写真： 新畑の前橋 橋長280.1m 架設年 1974年

令和7年9月

大洲市 建設部 建設課


1. 個別施設計画の目的

大洲市が管理する計画対象の橋梁は、令和7年9月現在、橋長15m以上の橋梁が89橋、橋長2m以上15m未満の橋梁が401橋、合計490橋が存在しています。


一般的に建設後50年が老朽化の目安とされており、大洲市においては建設年が分かっているのは173橋で、そのうち建設後50年を超える橋梁は現在54橋あり、10年後には93橋、20年後には134橋、30年後には154橋と増加することが分かっています（図-1 参照）。建設年の不明な316橋についてはさらに老朽化が進んでいることが予測されます。

このため、今後これら老朽化が進む橋梁に発生が予想される損傷や劣化に対して、従来の事後保全型の維持管理のみを継続した場合には、安全な通行を確保するための大規模修繕や架替え費用が一時的に集中し、多大な経費が市の財政負担となることとともに、維持管理対策が追い付かなくなるという懸念が生じています。


そこで計画的かつ効率的な予防保全を行い、橋梁長寿命化によるコスト縮減、費用の平準化を図るとともに安全性を確保することを目的として計画しました。

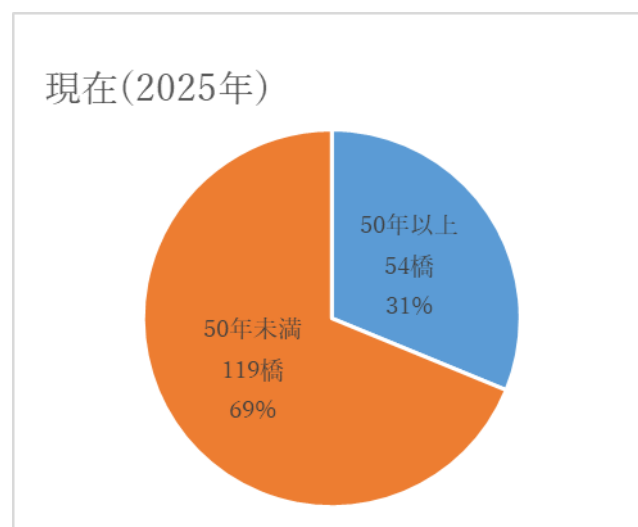

10年後(2035年)

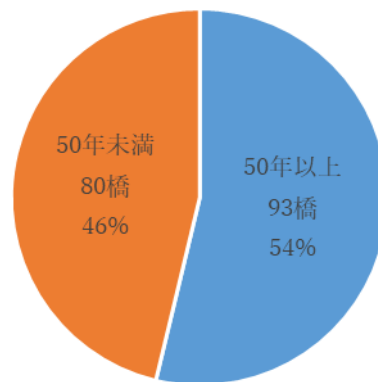

20年後(2045年)

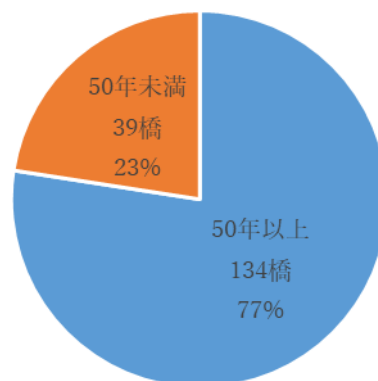

30年後(2055年)

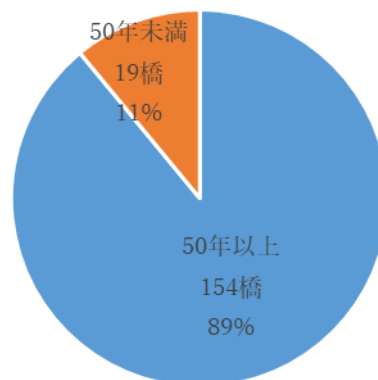


図-1 対象橋梁の供用年数の推移

2. 対象施設

本計画の対象施設は橋長 2m 以上の大洲市管理橋梁 489 橋となっています。

橋長別の分布状況は図-2 のとおりで、管理橋梁の約 82%は橋長 15m未満の橋梁です。ただし 100mを超える大規模橋も 10 橋あります。

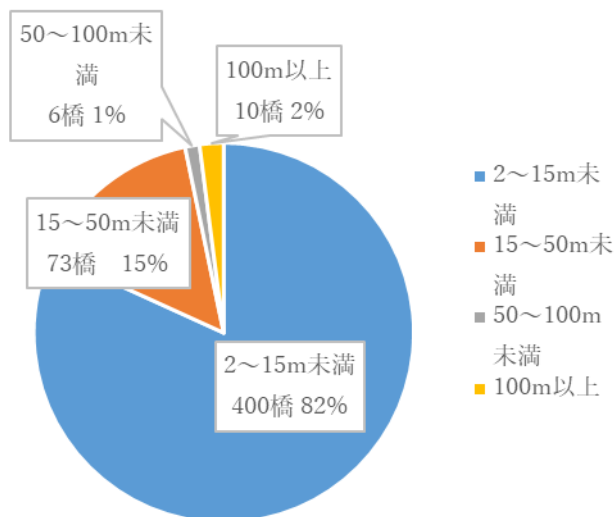


図-2 橋長別の橋梁数分布

供用年数別に分布状況を見てみると、図-3 に示すとおり、建設後 30 年以上の橋梁が 134 橋と約 27%を占めており、50 年以上経過している老朽橋梁は 54 橋となっています。

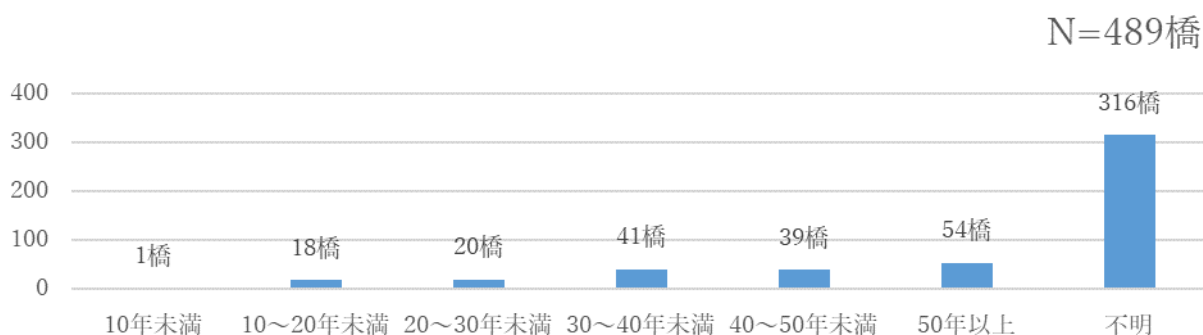


図-3 供用年数別の橋梁数分布

3. 計画期間

今後、実施する維持管理は、適切な時期に適切な修繕を実施するため、計画的な維持管理に転換するとともに、施設の長寿命化による維持管理・更新費用の縮減が重要です。

計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるよう10年とします。また、計画については点検結果等を踏まえ、適宜、更新します。

橋梁の健全度の把握は、「道路橋定期点検要領（国土交通省道路局 令和6年3月）に基づき、部材毎の損傷度を把握します。

今後も定期的な点検を実施することで、安全な橋の通行を確保するとともに、点検により損傷が明らかになった場合は、損傷が悪化する前に速やかに修繕を実施します。

点検では現地での健全度の把握結果をもとにし、橋梁毎損傷度を、橋梁各部材区分の損傷状況毎に表-1の4段階の区分を行い、評価します。

表-1 定期点検における健全度の区分

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

4. 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。

また、対策箇所の優先順位については、路線の重要性や橋梁の変状の状況による判定区分などを踏まえて実施します。

5. 施設の状態

大洲市では、市道で管理する橋梁において、平成26年度より順次点検を実施しており、現在までに点検を終えた結果について、表-2となります。

また、個別の点検結果については、大洲市ホームページ上で掲載することとします。

表-2 定期点検の判定結果(令和 6 年度末)

判 定	数
I	100 橋
II	367 橋
III	23 橋
IV	0 橋
計	490 橋

全 490 橋のうち 1 橋新設のため未点検

6. 今後の取り組み

6.1 集約化・撤去

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和 9 年度までに 2 橋程度の集約化・撤去を検討します。また、施設の機能縮小、複数施設の集約化などの検討、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用 2 百万円程度の縮減を目標とする。

6.2 新技術の導入・活用に関する方針

令和 9 年度までに、管理する市道橋のうち、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行うとともに、約 1 割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目標とする。

6.3 費用の縮減に関する方針

管理する市道橋については、新技術を活用した点検を重点的に検討し、令和 7 年度では約 40 万円のコストを縮減できる見込みです。また令和 9 年度までの 3 年間で約 3 百万円のコスト縮減に努めます。維持管理に係る修繕等の費用についても新技術等を活用し縮減を目指します。

7. 基本方針及び対策内容と実施時期、対策費用

今後は、道路法による定期点検（5 年に 1 回）を行ったうえで、橋梁の健全性を確保するとともに、健全度がⅢ以上として判定された橋については、速やかに対策を着手します。

また、健全度Ⅲ以上に判定された橋の修繕完了後は、健全度Ⅱの橋を対象に予防保全的な修繕を行います。

点検時期及び対策時期については、別表となります。

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最 新 点 検 年 度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				
1	峠橋	市道峠線	302.9	6.5	1986				●					●				Ⅱ	2021
2	新畑の前橋	市道立道線	280.1	6.0	1974	●	○		●			●				塗装塗替 床版補修	750	Ⅱ	2023
3	父橋	市道貫小屋線	171.1	3.0	1968		□		●					●				Ⅲ	2021
4	丁永橋	市道板鶴崎線	115.5	4.0	1979				●		○			●		塗装塗替	300	Ⅱ	2021
5	大河内橋	市道中組線	92.4	6.0	1975				●		○			●		塗装塗替	250	Ⅱ	2021
6	田之久保跨道橋	市道堂成線	72.5	4.0	2001		●					●						Ⅱ	2024
7	王子ヶ平橋	市道亀山線	67.1	4.1	1988			●					●					Ⅱ	2020
8	稲田橋	市道新谷八多喜新町線	54.7	5.2	1954			●					●					Ⅱ	2020
9	富士橋	市道如法寺柚木団地線	48.0	5.5	1979	△												Ⅱ	2021
10	野佐来跨道橋	市道札掛野佐来1号線	47.8	4.0	2004		●					●						Ⅱ	2024
11	仙介山跨道橋	市道堂成橋線	47.1	4.0	2000		●					●						Ⅱ	2024
12	金比羅橋	市道山口線	43.5	4.5	1966				●		○			●		塗装塗替	100	Ⅱ	2021
13	船渡橋	市道八多波線	43.4	4.0	1994				●					●				Ⅱ	2021
14	祇園橋	市道伯父畑1号線	39.0	2.0	1993			●					●					Ⅱ	2020
15	河春橋	市道折尾河春線	34.6	4.0	1988				●					●				Ⅱ	2021
16	嵩富橋	市道池田本久線	32.7	8.0	1987				●					●				Ⅱ	2021
17	本久橋	市道本久王子ヶ平線	32.5	4.0	1988				●					●				Ⅱ	2021
18	岡花橋	市道恋木内子線	31.6	5.0	1985				●					●				Ⅱ	2021
19	老谷橋	市道蔵川線	30.9	5.0	1991				●					●				Ⅱ	2021
20	下松尾橋	市道北只下団地線	30.4	4.0	1989				●					●				Ⅱ	2021
21	一ノ瀬橋	市道新谷満穂線	27.0	4.0	1982				●					●				Ⅱ	2021
22	城村橋	市道南久米保育所裏線	26.2	2.5	1976				●					●				Ⅱ	2021
23	徳森橋	市道オズメッセ東通り線	26.1	5.0	1987				●					●				Ⅱ	2021
24	金山橋	市道黒木野佐来線	26.0	6.5	1978			●					●					Ⅱ	2020
25	麓橋	市道一ノ瀬三島線	24.1	3.0	1976				●					●				Ⅱ	2021
26	嵩富橋	市道梅川札掛線	24.0	8.5	1983				●					●				Ⅱ	2021
27	蔵川梅川1号橋	市道蔵川梅川線	22.6	6.5	1981			●					●					Ⅱ	2020
28	矢落橋	市道矢落橋線	21.4	5.5	1935				●		○			●		塗装塗替	50	Ⅱ	2021
29	田野々橋	市道喜多山田野々線	21.0	3.0	1976				●					●				Ⅱ	2021
30	七曲橋	市道七曲線	20.4	4.0	1988				●					●				Ⅱ	2021
31	七反田橋	市道平野駅裏線	20.0	3.0	1977				●					●				Ⅱ	2021
32	桜谷橋	市道猿田五十崎線	20.0	4.0	1988				●					●				Ⅰ	2021
33	松元橋	市道清永川堤防線	19.2	2.5	1980				●					●				Ⅱ	2021
34	木樵場橋	市道木樵場線	18.7	4.0	1975			●					●					Ⅱ	2020
35	野佐来橋	市道北只野佐来線	18.6	6.6	1984			●					●					Ⅱ	2020
36	竹窪橋	市道竹窪線	18.4	4.0	1975			●					●					Ⅱ	2020
37	野久保橋	市道弁天田野々線	17.4	10.8	1993			●					●					Ⅱ	2020
38	長田橋	市道藤縄長浜線	17.1	4.0	1964			●			○			●		塗装塗替	20	Ⅱ	2020
39	堂成3号橋	市道堂成線	16.6	4.6	1986			●					●					Ⅱ	2020
40	無名橋3	市道黒木野佐来線	16.2	4.0	2000			●					●					Ⅱ	2020
41	鎌ノ田1号橋	市道鎌ノ田線	16.0	2.5	1979			●					●					Ⅰ	2020
42	茶屋川橋	市道大洲徳森線	15.6	6.0	1978			●					●					Ⅱ	2020
43	尾花橋	市道矢の口線	15.1	4.0	1982			●					●					Ⅱ	2020
44	高柳橋	市道田合線	26.8	2.5	1965				●		○			●		塗装塗替	30	Ⅱ	2021
45	中越橋	市道中山畦筋線	52.5	1.7	1973			●					●					Ⅱ	2020
46	花瀬橋	市道下松尾常森線	30.6	1.6	1975				●					●				Ⅱ	2021
47	湯ノ子橋	市道湯ノ子線	16.3	1.5	1972				●		○			●		床版補修	15	Ⅱ	2021
48	公園橋	市道運動公園線	19.2	12.0	1972			●			○		●			桁・床版補修	20	Ⅱ	2020
49	宇津橋	市道天貢線	197.0	7.5	2013				●					●				Ⅱ	2021
50	白滝大橋	市道白滝・柴線	240.1	10.6	2001	●	○		●		○			●		塗装塗替	420	Ⅱ	2023
51	晴海跨線橋	市道黒田・大屋線	180.5	7.0	2004		●					●						Ⅱ	2024
52	黒田橋	市道黒田・大屋線	40.7	7.5	1994				●					●				Ⅱ	2021

対象施設の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直近 判定	最新 点検 年度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				
53	宮のうね谷橋	市道黒田・大屋線	40.7	8.5	1997				●					●				Ⅱ	2021
54	大和橋	市道大薩・宮ノ下7号支線	27.7	2.1	1971				●					●				Ⅱ	2021
55	なかよし橋	市道大谷口・大戸線	26.0	6.2	1985				●					●				Ⅱ	2021
56	今大橋	市道大谷口・大戸線	22.8	6.2	1984				●					●				Ⅱ	2021
57	大和新橋	市道大薩・宮ノ下4号支線	23.1	3.0	1969				●					●				Ⅱ	2021
58	日の本橋	市道豆柳・大戸線	20.7	5.1	1979				●					●				Ⅱ	2021
59	とどろ橋	市道須・沢込ノ奥線	17.5	4.0	1975			●					●		○	塗装塗替	20	Ⅱ	2020
60	小屋敷橋	市道大薩・宮ノ下5号支線	15.9	2.0	1970			●		○			●			塗装塗替	20	Ⅱ	2020
61	三号橋	市道大薩・宮ノ下6号支線	15.9	2.0	1971			●					●		○	塗装塗替	20	Ⅱ	2020
62	大久保橋	市道大久保線	14.9	5.0	1959			●		○			●			床版補修	15	Ⅱ	2020
63	愛生橋	市道郷本線	22.2	7.0	2007				●					●				Ⅰ	2021
64	中央橋	市道郷1号線	22.2	4.0	2006				●					●				Ⅰ	2021
65	道野尾橋	市道鳥首道野尾線	118.8	5.8	1988				●					●				Ⅱ	2021
66	赤岩橋	市道宇和川赤岩線	101.5	7.0	1999				●					●				Ⅱ	2021
67	京造新橋	市道富永武田線	31.9	3.5	1975					●					●			Ⅱ	2022
68	新田橋	市道鹿野川橋新町線	30.6	4.0	1976					●					●			Ⅱ	2022
69	本願寺橋	市道捷水路堀越跡線	28.4	2.6	1962					●		○			●	床版補修	15	Ⅱ	2022
70	京造橋	市道大坪息引線	28.0	3.5	1976					●					●			Ⅱ	2022
71	入船橋	市道鹿馬津下嵯峨谷線	21.5	4.0	1960					●					●			Ⅱ	2022
72	コクボ橋	市道大谷橋大地トンネル線	19.8	3.5	1992	●					●							Ⅱ	2023
73	岩谷橋	市道岩谷松の久保線	18.8	3.6	1959					●				○	●	桁・床版補修	20	Ⅱ	2022
74	新都々呂橋	市道鴨谷熊の坂線	30.3	4.0	2004					●					●			Ⅱ	2022
75	河都大橋	市道名場連奈良野線	28.0	4.0	1985					●					●			Ⅱ	2022
76	七曲橋	市道寺薮川崎線	24.4	4.0	1977					●					●			Ⅱ	2022
77	中居橋	市道中居線	24.2	5.0	1996					●					●			Ⅱ	2022
78	円永橋	市道植松中津線	23.2	3.6	1961					●					●			Ⅱ	2022
79	国木橋	市道国木長崎線	20.5	3.6	1970					●					●			Ⅱ	2022
80	榎橋	市道榎線	22.4	3.6	1973					●	○				●	塗装塗替 桁補修	25	Ⅲ	2022
81	坂本橋	市道坂本中居線	22.3	3.6	1973					●					●			Ⅱ	2022
82	槌橋	市道神納小屋線	17.4	3.6	1970			●					●		○	塗装塗替	20	Ⅱ	2020
83	河都第一橋	市道寺薮川崎線	15.3	4.9	1987					●					●			Ⅱ	2022
84	堂成1号橋	市道堂成線	7.8	4.0	不明			●		○			●			塗装塗替	10	Ⅱ	2020
85	高堰橋	市道若宮徳森線	14.4	4.0	1996	●					●							Ⅱ	2023
86	蔵川4号橋	市道蔵川線	14.4	4.0	1957	●					●		○			床版補修	15	Ⅱ	2023
87	都谷川橋	市道田口徳森線	14.4	16.5	1996			●					●					Ⅱ	2020
88	中山東1号橋	市道中山東線	13.8	3.0	948(推定)	●					●		○			床版補修	10	Ⅱ	2023
89	黒木野佐来2号橋	市道黒木野佐来線	13.8	3.5	1973	●					●							Ⅱ	2023
90	居場橋	市道居場五郎線	13.6	3.0	不明	●	○			○	●					床版補修 洗堀対策	20	Ⅱ	2023
91	西峰橋	市道東西峰循環線	13.6	3.0	948(推定)	●					●			○		床版補修	10	Ⅱ	2023
92	田処小学校1号橋	市道田処小学校線	13.5	3.9	不明			●					●					Ⅱ	2020
93	都谷橋	市道大洲北1C東線	13.2	9.5	1993			●					●					Ⅱ	2020
94	都谷橋	市道大洲北1C西線	13.2	9.5	1993			●					●					Ⅱ	2020
95	小屋床橋	市道河向線	13.1	3.0	不明	●				○	●					橋台補修	10	Ⅲ	2023
96	一ノ瀬橋	市道松久保1号線	13.1	5.5	1981			●					●					Ⅱ	2020
97	小学校橋	市道栗津小学校線	13.0	3.0	1996			●					●					Ⅱ	2020
98	下黒木1号橋	市道下黒木1号線	12.9	3.0	不明				●					●				Ⅱ	2021
99	勢々橋	市道上町米津線	12.8	7.0	2005					●					●			Ⅱ	2022
100	八河橋	市道八河線	12.5	4.0	948(推定)	●					●		○			床版補修	10	Ⅱ	2023
101	落合橋	市道松久保3号線	12.1	4.0	1982	●					●							Ⅱ	2023
102	湯の町1号橋	市道湯の町線	12.0	5.5	不明	●					●							Ⅱ	2023
103	中梅川1号橋	市道中梅川線	11.8	5.5	962(推定)	●					●							Ⅱ	2023
104	香田橋	市道野田団地1号線	11.4	8.0	1987				●					●				Ⅰ	2021

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検(●)・修繕(○)・更新(□)・撤去(△)・架設(◎)											補修内容	補修費用 (百万円)	直近 判定	最新 点検 年度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14					
105	椋元橋	市道蔵川線	10.6	4.0	1960	●					●				○		床版補修	15	Ⅱ	2023
106	下切1号橋	市道下切線	11.1	3.0	不明	●					●								Ⅱ	2023
107	武陵駄馬1号橋	市道武陵駄馬線	11.0	4.0	不明			●					●			○	床版補修	10	Ⅱ	2020
108	藤縄橋	市道七曲線	11.0	4.0	1988	●					●					○	床版補修	10	Ⅱ	2023
109	西和田東1号橋	市道西和田東線	11.0	6.0	不明			●					●			○	床版補修	10	Ⅱ	2020
110	西和田西1号橋	市道西和田西3号線	11.0	3.9	不明	●					●								Ⅱ	2023
111	大洲1号橋	市道大洲線	11.0	2.0	不明	●					●								Ⅱ	2023
112	新古川橋	市道東大洲11号線	11.0	14.0	2006				●						●				I	2021
113	久保橋	市道永田2号線	10.5	4.0	1989	●					●								Ⅱ	2023
114	武陵1号橋	市道武陵線	10.4	2.8	962(推定)	●	○				●						床版補修	10	Ⅱ	2023
115	大貨橋	市道蔵川線	10.4	4.0	1970	●					●								Ⅱ	2023
116	富士山1号橋	市道富士山線	11.7	5.1	962(推定)	●					●					○	床版補修	10	Ⅱ	2023
117	新谷八多喜新町7号橋（玉反田橋）	市道新谷八多喜新町線	9.8	4.0	1996					●						●			I	2022
118	八多喜田処1号橋（床前橋）	市道八多喜田処線	9.6	6.0	1988					●						●			Ⅱ	2022
119	黒木野佐来3号橋	市道黒木野佐来線	9.7	4.0	1973	●					●								Ⅱ	2023
120	日の出橋	市道東大洲6号線	9.6	14.6	1996				●						●				I	2021
121	除家土手1号橋	市道除家土手線	9.6	4.0	962(推定)	●					●								Ⅱ	2023
122	矢の口2号橋	市道矢の口栄谷線	9.4	4.0	950(推定)	●					●			○			床版補修	10	Ⅱ	2023
123	池田橋	市道池田線	9.4	3.2	951(推定)	●					●					○	床版補修	10	Ⅱ	2023
124	大田3号橋	市道大田線	9.4	4.0	950(推定)	●					●			○			床版補修	10	Ⅱ	2023
125	徳森団地2号橋	市道徳森団地2号線	9.0	4.0	942(推定)	●	○				●						床版補修	17	Ⅱ	2023
126	川上1号橋	市道川上線	9.0	4.1	不明	●	○				●						塗装塗替 床版補修	20	Ⅱ	2023
127	恵美須橋	市道恵美須橋線	8.8	1.4	不明	●					●								Ⅱ	2023
128	西和田1号橋	市道西和田線	8.8	6.0	953(推定)	●					●					○	床版補修	10	Ⅱ	2023
129	徳森団地3号橋	市道徳森団地3号線	8.7	4.0	948(推定)	●					●			○			床版補修	10	Ⅱ	2023
130	徳森団地4号橋	市道徳森団地4号線	7.0	4.0	942(推定)	●	○				●						床版補修	11	Ⅱ	2023
131	黒内坊橋	市道猿田五十崎線	8.1	6.5	1984	●					●								Ⅱ	2023
132	中和田1号橋	市道中和田線	8.7	4.0	964(推定)	●					●								Ⅱ	2023
133	井口田野々1号橋	市道井口田野々1号線	8.7	6.0	964(推定)	●					●								Ⅱ	2023
134	折尾河春1号橋	市道折尾河春線	9.5	6.3	1987	●					●								Ⅱ	2023
135	新大戸橋	市道川之石線	8.4	4.0	1982	●					●								Ⅱ	2023
136	和田1号橋	市道和田線	8.2	6.1	不明				●						●				Ⅱ	2022
137	五反田橋	市道会心矢の口線	13.5	2.5	1982	●					●								Ⅱ	2023
138	波多波1号橋	市道松久保6号線	8.3	2.0	954(推定)	●	○				●						床版補修	8	Ⅱ	2023
139	千丈峠橋	市道保子野本谷線	8.2	4.0	965(推定)	●					●								Ⅱ	2023
140	下黒木3号橋	市道下黒木3号線	8.0	4.0	965(推定)	●					●								Ⅱ	2023
141	東大洲24号橋（小島越橋）	市道東大洲15号線	14.9	6.0	2007	●					●								Ⅱ	2023
142	面川橋	市道面川線	7.9	3.0	008(推定)	●	○				●						塗装塗替 橋台補修	10	Ⅱ	2023
143	梶谷1号橋	市道梶谷線	8.3	3.0	996(推定)	●	○				●						塗装塗替	8	Ⅱ	2023
144	本谷大田1号橋	市道本谷大田線	7.3	3.0	943(推定)	●	○				●						桁・床版補修	8	Ⅱ	2023
145	てんぐ橋	市道駄馬線	7.2	4.0	1983	●					●								Ⅱ	2023
146	東大洲15号橋	市道東大洲10号線	7.1	3.9	963(推定)	●					●								Ⅱ	2023
147	秋葉山1号橋	市道秋葉山線	7.1	4.0	943(推定)	●	○				●						床版補修	10	Ⅱ	2023
148	はしをば橋	市道春賀河内線	7.2	4.3	964(推定)				●						●				Ⅱ	2022
149	東大洲20号橋	市道東大洲13号線	7.0	4.0	942(推定)	●	○				●						床版補修	12	Ⅱ	2023
150	東大洲22号橋	市道東大洲14号線	7.0	3.8	964(推定)				●						●				Ⅱ	2021
151	徳森団地1号橋	市道徳森団地1号線	7.0	6.0	941(推定)	●					●								Ⅱ	2023
152	春賀3号橋	市道春賀線	7.0	2.3	965(推定)					●					●				I	2022
153	東大洲9号橋	市道東大洲7号線	6.8	6.9	952(推定)				●			○			●		床版補修	10	Ⅱ	2021
154	鍾乳洞橋	市道蔵川線	6.1	4.0	1957	●					●			○			床版補修	10	Ⅱ	2023
155	東大洲13号橋	市道東大洲9号線	6.7	4.0	942(推定)	●					●			○			床版補修	10	Ⅱ	2023
156	北只野佐来1号橋	市道北只野佐来線	6.7	8.0	1984	●					●								Ⅱ	2023

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定年	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直近 判定	最新 点検 年度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
157	二軒茶屋1号橋	市道二軒茶屋1号線	6.6	4.0	964(推定)	●					●							II	2023
158	東大洲16号橋	市道東大洲11号線	6.5	3.8	963(推定)				●					●	○	床版補修	10	II	2021
159	東大洲18号橋	市道東大洲12号線	6.6	4.0	948(推定)				●					●	○	床版補修	10	I	2021
160	立道3号橋	市道立道線	6.5	5.8	1974				●					●				II	2021
161	新谷五十崎1号橋	市道新谷五十崎線	6.1	4.0	1953(推定)	●					●	○				床版補修	10	III	2023
162	大田1号橋	市道大田線	6.4	1.9	1965(推定)	●					●							II	2023
163	東大洲19号橋	市道東大洲12号線	6.3	4.0	1948(推定)				●		○			●		床版補修	10	II	2021
164	東大洲23号橋	市道東大洲14号線	6.3	4.0	1964(推定)				●					●				I	2021
165	徳森団地6号橋	市道徳森団地6号線	6.3	4.0	1942(推定)	●	○				●					床版補修	12	II	2023
166	我佛1号橋	市道我佛線	5.8	4.0	1964(推定)	●					●							II	2023
167	東大洲11号橋	市道東大洲8号線	6.7	4.0	1941(推定)				●		○			●		床版補修	10	II	2021
168	東大洲25号橋	市道東大洲15号線	6.5	4.0	2007	●					●							II	2023
169	下黒木2号橋	市道下黒木1号線	6.2	5.0	1965(推定)	●					●							II	2023
170	溪寿寺1号橋	市道溪寿寺線	6.0	5.2	1965(推定)	●					●							II	2023
171	和田1号橋	市道和田2号線	6.1	13.7	1964(推定)	●					●							II	2023
172	幸田橋	市道幸田線	7.8	4.0	1949(推定)	●					●				○	床版補修	10	II	2023
173	新谷中学校1号橋	市道新谷中学校線	6.7	4.1	1985	●					●							II	2023
174	西和田東橋	市道西和田東2号線	6.2	3.0	1954(推定)	●					●				○	床版補修	10	II	2023
175	上梅川1号橋	市道上梅川線	6.0	4.3	1965(推定)	●					●							II	2023
176	横山橋	市道赤田線	5.8	4.1	1969	●					●							II	2023
177	川東1号橋	市道川東線	5.8	3.3	1965(推定)	●					●							II	2023
178	春賀河内3号橋	市道春賀河内線	5.6	5.5	1948(推定)				●				○		●	床版補修	10	II	2022
179	春賀2号橋	市道春賀線	5.7	6.1	1959(推定)				●						●			II	2022
180	新谷八多喜新町3号橋	市道新谷八多喜新町線	5.5	5.6	1954	●					●				○	床版補修	10	II	2023
181	神南住宅1号橋	市道神南住宅線	5.5	5.5	1965(推定)	●					●							II	2023
182	和田2号1号橋	市道和田2号線	6.2	4.0	1960(推定)					●					●			II	2022
183	東大洲12号橋	市道東大洲9号線	5.2	4.0	1964(推定)	●					●							II	2023
184	栄谷1号橋	市道栄谷線	5.4	3.0	1986(推定)	●	○				●							II	2023
185	本谷1号橋	市道本谷線	5.7	4.3	1965(推定)	●					●							II	2023
186	東大洲14号橋	市道東大洲10号線	4.9	4.0	1963(推定)	●					●							II	2023
187	都橋	市道都線	4.8	3.0	1964(推定)	●					●							II	2023
188	徳森公園1号橋	市道徳森公園線	5.2	38.2	1964(推定)	●					●							II	2023
189	新谷八多喜新町6号橋	市道新谷八多喜新町線	6.7	8.3	1954					●			○		●	床版補修	10	II	2022
190	春賀5号橋	市道春賀1号線	6.0	3.5	1965(推定)					●					●			I	2022
191	和田上2号橋	市道和田上線	4.7	8.5	1965(推定)					●					●			II	2022
192	山口3号橋	市道山口線	4.5	4.0	1966	●					●							II	2023
193	立道2号橋	市道立道線	5.0	6.0	1974				●					●				II	2021
194	和田東1号橋	市道和田東線	4.4	3.0	1949(推定)					●			○		●	床版補修	6	II	2022
195	徳森団地8号橋	市道徳森団地11号線	4.6	4.0	1942(推定)	●					●			○		床版補修	6	II	2023
196	徳森団地9号橋	市道徳森団地14号線	4.8	4.0	1942(推定)	●			○		●					床版補修	12	III	2023
197	和田上1号橋	市道和田上線	4.2	8.9	1943(推定)					●			○		●	床版補修	6	II	2022
198	梶ヤシキ1号橋	市道梶ヤシキ線	4.9	3.6	1965(推定)	●					●							II	2023
199	春賀河内1号橋	市道春賀河内線	4.7	8.4	1949(推定)					●			○		●	床版補修	6	II	2022
200	大谷1号橋	市道大谷線	4.6	3.8	1965(推定)	●					●							II	2023
201	蔽島神社1号橋	市道蔽島神社線	4.6	6.0	1965(推定)					●					●			II	2022
202	宮ノ谷1号橋	市道宮ノ谷線	4.5	6.1	1949(推定)	●					●				○	床版補修	8	II	2023
203	新谷八多喜新町5号橋	市道新谷八多喜新町線	3.5	3.3	1954					●					●			II	2022
204	初尾橋	市道大洲上須成線	12.5	6.5	1954(推定)	●					●				○	床版補修	15	II	2023
205	へんだな橋	市道加屋・本郷線	13.0	9.2	1992					●					●			II	2022
206	よのき1号橋	市道上老松ノ瀬線	11.6	6.6	1962(推定)					●					●			II	2022
207	大屋1号橋	市道大谷線	12.0	5.6	不明					●					●			II	2022
208	久保田橋	市道駄馬線	11.0	4.0	1962(推定)					●					●			II	2022

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]												補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最新 点 検 年 度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14						
209	田淵口橋	市道田ノ淵線	12.3	3.0	2004					●					●			Ⅱ	2022		
210	錦橋	市道滝川線	10.9	2.2	1960					●					●			Ⅱ	2022		
211	柳瀬橋	市道石堂豆柳線	10.7	5.0	1986					●					●			Ⅱ	2022		
212	田ノ淵奥橋	市道田ノ淵2号線	14.6	1.5	1948(推定)					●		○			●	床版補修	6	Ⅱ	2022		
213	小田際橋	市道日ノ浦小田際線	9.7	5.0	1986					●					●			Ⅰ	2022		
214	野田川橋	市道出海浜保内線	9.6	2.0	1984(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
215	陰数橋	市道常水線	9.7	5.0	1964(推定)					●					●			Ⅰ	2022		
216	長谷橋	市道松本線	9.0	1.8	2006(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
217	上老松橋	市道黒田上老松線	9.0	3.5	1971					●					●			Ⅱ	2022		
218	浜橋	市道櫛生浜通2号線	8.6	4.0	1984(推定)	○	○			●					●	桁補修	35	Ⅲ	2022		
219	改善橋	市道中央郷線	8.5	3.0	1965					●					●			Ⅱ	2022		
220	大井手橋	市道大井手・大谷線	8.1	3.0	1949(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
221	倉根橋	市道貝垣・喜多瀬駅線	8.5	4.0	1967					●					●			Ⅱ	2022		
222	豊中橋	市道柴本村線	8.3	3.5	1970					●					●			Ⅱ	2022		
223	坂本橋	市道柴沖1号線	19.3	4.0	2011					●					●			Ⅰ	2022		
224	第一横松郷橋	市道横松郷線	8.1	2.5	1990(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
225	貝垣橋	市道貝垣線	8.6	16.2	不明					●					●			Ⅱ	2022		
226	白方橋	市道白方・肱川線	8.1	3.4	1970					●					●			Ⅱ	2022		
227	フキノサコ橋	市道喜多灘・下灘線	8.1	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
228	田淵橋	市道加屋・本郷線	12.7	6.2	2002					●					●			Ⅱ	2022		
229	港1号橋	市道海岸線	8.5	2.0	2004					●					●			Ⅱ	2022		
230	幸福橋	市道駅前線	8.4	4.2	1949(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
231	幸福橋	市道豆柳・大戸線	7.0	5.0	1981					●					●			Ⅱ	2022		
232	浜宮橋	市道高峰1号線	7.7	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
233	朝日橋	市道朝日・連上線	7.6	4.6	1960					●					●			Ⅱ	2022		
234	河原橋	市道安養寺線	7.5	4.5	1942(推定)					●		○			●	床版補修	6	Ⅱ	2022		
235	下向橋	市道黒田・大屋線	7.5	3.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
236	高峰橋	市道高峰2号線	6.5	4.5	2001(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
237	上フケ橋	市道大谷口大戸線	6.7	5.8	1984					●					●			Ⅱ	2022		
238	見返橋	市道滝川線	8.4	1.5	不明					●					●			Ⅱ	2022		
239	拓海橋	市道拓海1号線	7.1	7.5	1990					●					●			Ⅱ	2022		
240	落合橋	市道滝川線	3.5	1.5	不明					●					●			Ⅱ	2022		
241	第三横松郷橋	市道峰今坊線	9.2	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
242	幸口橋	市道拓海1号線	8.8	11.6	1990					●					●			Ⅱ	2022		
243	港2号橋	市道出海港2号線	6.6	2.4	1984(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
244	第四横松郷橋	市道峰今坊線	6.9	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
245	しりくみ橋	市道出海線	7.5	4.3	1965(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
246	みやのうね橋	市道長浜戒川線	6.0	4.0	1968					●					●			Ⅱ	2022		
247	萩坂橋	市道豆柳・大戸線	6.5	5.0	1982					●					●			Ⅱ	2022		
248	くるまや橋	市道滝川線	6.9	1.3	不明					●					●			Ⅰ	2022		
249	下番上橋	市道出海・中腹線	6.0	3.2	1949(推定)					●		○			●	床版補修	10	Ⅱ	2022		
250	竜王橋	市道高峰1号線	6.1	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
251	尾仲4号橋	市道出海・中腹線	6.0	3.1	1960(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
252	大谷橋	市道大屋本通線	6.0	3.0	1974					●					●			Ⅱ	2022		
253	日の浦橋	市道貝垣・喜多瀬駅線	6.0	5.0	1962					●					●			Ⅱ	2022		
254	櫛生橋	市道櫛生線	7.2	5.0	1963					●					●			Ⅱ	2022		
255	坂本4号橋	市道出海線	7.5	3.6	1960(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
256	大屋橋	市道今坊・築地1号線	5.2	4.7	1942(推定)					●		○			●	床版補修	10	Ⅱ	2022		
257	大谷川4号橋	市道大谷口1号線	5.3	2.9	2006(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
258	水口橋	市道須沢・中ウ子線	5.5	4.0	1964(推定)					●					●			Ⅱ	2022		
259	込ノ奥橋	市道須沢・込ノ奥線	5.5	7.4	不明					●					●			Ⅱ	2022		
260	戒川橋	市道本郷・長尾線	5.4	4.0	1977					●					●			Ⅱ	2022		

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]													補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最 新 点 検 年 度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14							
261	坂本1号橋	市道長町2号線	5.1	1.7	1954(推定)					○	●					●	床版補修	7	Ⅲ	2022		
262	土居2号橋	市道長町1号線	5.4	2.3	1943(推定)					●			○			●	床版補修	5	Ⅱ	2022		
263	三島橋	市道須沢・込ノ奥線	5.2	2.9	不明					●						●			Ⅱ	2022		
264	出海橋	市道出海本線	5.9	4.8	1975					●						●			Ⅱ	2022		
265	西岡橋	市道須沢・込ノ奥線	5.0	6.2	不明				●				●						Ⅱ	2020		
266	来光橋	市道滝川線	5.0	1.5	不明					●						●			Ⅱ	2022		
267	永平橋	市道加屋・山崎線	5.0	6.6	不明					●						●			Ⅱ	2022		
268	豊茂橋	市道朝日・連上線	5.0	4.8	1961					●						●			Ⅱ	2022		
269	坂本6号橋	市道出海線	12.3	5.0	2008					●						●			Ⅱ	2022		
270	中津橋	市道タルガウチタニクチ線	11.4	4.6	1933					●						●			Ⅱ	2022		
271	小敷川橋	市道滝山丸測線	10.3	5.1	1924	●	○				●						桁・橋台補修	25	Ⅱ	2023		
272	影地橋	市道広常影地線	9.8	10.3	1997	●					●								Ⅱ	2023		
273	野仁山橋	市道上広常野仁山線	8.8	4.0	1987	●					●								Ⅱ	2023		
274	橋詰橋	市道橋詰宮の下線	8.6	4.0	1978	●					●								Ⅱ	2023		
275	大豊橋	市道大平森線	8.5	5.0	1963	●					●								Ⅱ	2023		
276	滝山橋	市道滝山奥小敷線	8.1	5.5	1981	●					●								Ⅱ	2023		
277	曲田橋	市道曲田嘉城線	7.5	5.2	1988	●					●								Ⅱ	2023		
278	沖野屋橋	市道沖野屋橋宮の下線	8.1	4.0	1972	●					●								Ⅱ	2023		
279	久保橋	市道芦原込山線	7.1	4.0	1967	●					●								Ⅱ	2023		
280	上轟橋	市道小日本笠掛線	6.5	4.1	1972	●					●								Ⅱ	2023		
281	三杯谷橋	市道神納川上線	10.6	4.0	1976					●	○					●	桁補修	20	Ⅲ	2022		
282	長崎第一橋	市道一の瀬日其川線	9.4	4.5	1962					●						●			Ⅱ	2022		
283	鳴滝第三橋	市道植松中津線	9.1	4.5	不明					●						●			Ⅰ	2022		
284	鳴滝第一橋	市道植松中津線	6.6	4.7	不明					●						●			Ⅱ	2022		
285	下大成橋	市道下大成下地野線	5.4	4.0	1964(推定)					●						●			Ⅰ	2022		
286	日其川第一橋	市道一の瀬日其川線	5.2	3.6	不明					●						●			Ⅱ	2022		
287	鳴滝第二橋	市道松の久保線	5.0	3.4	1964(推定)					●						●			Ⅰ	2022		
288	大向橋	市道大向線	10.6	3.0	1977					●						●			Ⅱ	2022		
289	藤ノ川1号橋	市道藤ノ川線	4.5	4.2	不明				●				●						Ⅰ	2020		
290	伊口1号橋	市道伊口線	4.4	4.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
291	杭瀬2号橋	市道杭瀬1号線	4.4	3.5	不明		●						●						Ⅰ	2024		
292	柳沢新谷1号橋	市道柳沢新谷線	4.4	6.6	不明		●						●						Ⅰ	2024		
293	東大洲10号橋	市道東大洲8号線	4.3	4.1	不明		●						●						Ⅰ	2024		
294	長谷1号橋	市道長谷線	4.3	4.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
295	長谷2号橋	市道長谷線	4.3	4.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
296	念峠1号橋	市道念峠線	4.3	4.0	不明				●					●					Ⅰ	2020		
297	喜多山駅1号橋	市道喜多山駅線	4.3	3.7	不明		●						●						Ⅰ	2024		
298	徳森団地5号橋	市道徳森団地5号線	3.8	4.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
299	新川橋	市道新川線	4.2	2.9	不明		●						●						Ⅰ	2024		
300	池田成見1号橋	市道池田成見線	4.2	5.5	不明		●						●						Ⅰ	2024		
301	田合2号橋	市道田合線	4.2	4.6	不明		●						●						Ⅱ	2024		
302	喜行橋	市道大洲久米線	43.0	6.0	2007					●						●			Ⅱ	2021		
303	春賀1号橋	市道春賀線	4.1	6.6	不明		●						●						Ⅰ	2024		
304	春賀見上1号橋	市道春賀見上線	4.1	10.0	不明		●						●						Ⅱ	2024		
305	上河内1号橋	市道上河内線	4.1	4.6	不明		●						●						Ⅰ	2024		
306	鎌ノ田2号橋	市道鎌ノ田線	4.0	3.9	不明		●						●						Ⅰ	2024		
307	大田2号橋	市道太田線	4.0	3.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
308	東大洲5号橋	市道東大洲5号線	3.9	8.7	不明		●						●						Ⅰ	2024		
309	東大洲6号橋	市道東大洲6号線	3.9	4.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
310	東大洲8号橋	市道東大洲7号線	3.9	6.0	不明		●						●						Ⅰ	2024		
311	阿蔵団地1号橋	市道阿蔵団地1号線	5.7	8.3	不明		●						●						Ⅱ	2024		
312	筒井1号橋	市道筒井線	3.6	10.4	不明		●						●						Ⅰ	2024		

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最 新 点 検 年 度
						2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14				
313	東大洲1号橋	市道東大洲1号線	3.8	8.5	不明		●					●						I	2024
314	藤ノ川2号橋	市道藤ノ川線	3.8	4.0	不明			●					●					I	2020
315	馬くびり2号橋	市道馬くびり線	3.8	3.9	不明		●					●						II	2024
316	伊州子1号橋	市道伊州子線	6.6	4.0	不明		●					●						I	2024
317	滝の口1号橋	市道滝の口線	3.8	5.1	不明		●					●						II	2024
318	岩清水ネノゴエ4号橋	市道岩清水ネノゴエ線	3.7	3.0	不明		●					●						I	2024
319	大洲徳森1号橋	市道大洲徳森線	2.9	5.8	不明		●					●						I	2024
320	東大洲4号橋	市道東大洲4号線	3.7	9.0	不明		●					●						II	2024
321	長谷梅川1号橋	市道長谷梅川線	3.6	6.3	不明		●					●						I	2024
322	東和田1号橋	市道東和田線	3.7	9.5	不明		●					●						I	2024
323	東大洲2号橋	市道東大洲2号線	3.6	9.5	不明		●					●						II	2024
324	東大洲3号橋	市道東大洲3号線	3.6	11.0	不明		●					●						II	2024
325	黒橋1号橋	市道黒橋線	3.6	5.2	不明		●					●						I	2024
326	田処境1号橋	市道田処境線	3.6	5.1	不明		●					●						II	2024
327	大東1号橋	市道大東線	3.6	4.5	不明				●					●				II	2021
328	下山辺1号橋	市道下山辺5号線	3.5	13.4	不明		● ○			○		●				床版補修	16	Ⅲ	2024
329	平地慶雲寺2号橋	市道平地慶雲寺線	3.5	4.9	不明		●					●						I	2024
330	清水1号橋	市道清水4号線	3.5	2.5	不明		●					●						I	2024
331	栄谷2号橋	市道栄谷線	3.0	4.0	不明		●					●						II	2024
332	大貸小蔵1号橋	市道大貸小蔵線	3.5	3.5	不明		●					●						II	2024
333	大暮1号橋	市道大暮線	3.5	4.9	不明		●					●						I	2024
334	上組1号橋	市道上組3号線	3.5	6.3	不明		●					●						I	2024
335	堂成2号橋	市道堂成線	3.5	5.0	不明		●					●						I	2024
336	八多喜田処2号橋	市道八多喜田処線	3.5	4.4	不明		●					●						I	2024
337	能登団地1号橋	市道能登団地10号線	3.4	4.0	不明		●					●						I	2024
338	清水1号橋	市道清水2号線	2.8	3.0	不明		●					●						I	2024
339	東和田2号橋	市道東和田線	3.4	7.0	不明		●					●						I	2024
340	中東3号1号橋	市道中東3号線	3.3	4.8	不明		●					●						I	2024
341	大貸小蔵2号橋	市道大貸小蔵線	3.3	3.9	不明		● ○					●				床版補修	12	I	2024
342	後谷1号橋	市道後谷線	3.3	4.8	不明		●					●						I	2024
343	五郎研修センター1号橋	市道五郎研修センター線	3.3	5.7	不明		●					●						I	2024
344	池富高森1号橋	市道池富高森線	3.2	2.8	不明		●					●						I	2024
345	清水2号橋	市道清水4号線	3.2	2.8	不明		●					●						I	2024
346	北只横野2号橋	市道北只横野線	3.2	4.1	不明		● ○					●				床版補修	10	I	2024
347	我佛2号橋	市道我佛線	3.0	3.6	不明		●	○				●				洗堀対策	10	Ⅲ	2024
348	新谷八多喜新町4号橋	市道新谷八多喜新町線	3.2	5.1	不明		●					●						II	2024
349	山口2号橋	市道山口線	3.2	3.8	不明		●					●						I	2024
350	八尾一本松1号橋	市道八尾一本松線	2.6	4.3	不明	● ○					●					床版・橋台補修	7	II	2023
351	沼田3号橋	市道沼田線	3.1	4.2	不明		●					●						II	2024
352	下山辺2号橋	市道下山辺6号線	2.7	6.9	不明		●					●						I	2024
353	東大洲26号橋	市道東大洲17号線	3.5	7.8	不明		●					●						I	2024
354	富元1号橋	市道富元線	3.0	3.5	不明		●					●						I	2024
355	長谷梅川2号橋	市道長谷梅川線	3.0	10.2	不明		●					●						I	2024
356	八河天貢1号橋	市道八河天貢線	3.0	3.8	不明		●					●						I	2024
357	立山5号橋	市道立山線	3.0	4.0	2021			●					●					I	2020
358	富元2号橋	市道富元線	2.9	6.2	不明		●					●						I	2024
359	惣谷1号橋	市道惣谷線	2.9	2.6	不明		●	○				●				洗堀対策	6	Ⅲ	2024
360	西和田東2号橋	市道西和田東1号線	2.9	5.7	不明		●					●						I	2024
361	手成本村2号橋	市道手成本村線	2.9	12.9	不明		●					●						I	2024
362	岩清水ネノゴエ1号橋	市道岩清水ネノゴエ線	2.8	3.7	不明		●				□	●				更新		Ⅲ	2025
363	無名橋1	市道立道線	3.5	7.0	不明		●					●						I	2024
364	梶屋谷1号橋	市道梶屋谷線	2.8	3.8	不明		●					●						I	2024

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最 新 点 検 年 度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14				
365	梶屋谷2号橋	市道梶屋谷線	2.8	3.1	不明			●					●					Ⅱ	2020
366	北只横野3号橋	市道北只横野線	2.8	4.7	不明			●					●					Ⅱ	2020
367	立山3号橋	市道立山線	2.8	3.9	不明			●					●					Ⅱ	2020
368	立山4号橋	市道立山線	2.8	3.9	不明			●					●					Ⅱ	2020
369	春賀見上2号橋	市道寿線	2.8	6.8	不明			●					●					Ⅱ	2020
370	田淵2号1号橋	市道田淵2号線	2.9	5.8	不明		●					●						Ⅰ	2024
371	北只横野5号橋	市道北只横野線	2.7	5.5	不明			●					●					Ⅱ	2020
372	内通り長浜1号橋	市道内通り長浜線	2.7	10.4	不明		●					●						Ⅰ	2024
373	田淵3号橋	市道田淵1号線	2.5	3.1	不明		●					●						Ⅰ	2024
374	平地慶雲寺1号橋	市道平地慶雲寺線	2.6	9.3	不明		●		○	○		●				床版補修	10	Ⅲ	2024
375	犬掛1号橋	市道犬掛線	2.6	5.7	不明			●					●					Ⅱ	2020
376	無名橋1	市道川上線	2.6	6.1	不明			●					●					Ⅱ	2020
377	徳森団地7号橋	市道徳森団地7号線	3.0	7.1	不明	●	○				●					床版補修	5	Ⅱ	2023
378	宮ノ谷2号橋	市道宮ノ谷線	2.5	4.0	不明			●					●					Ⅱ	2020
379	北只横野1号橋	市道北只横野線	2.5	5.0	不明			●	○				●			床版補修	6	Ⅲ	2020
380	北只横野4号橋	市道北只横野線	2.5	5.4	不明			●					●					Ⅱ	2020
381	西和田2号橋	市道西和田線	2.5	4.0	不明			●					●					Ⅱ	2020
382	一ツ木1号橋	市道一ツ木線	2.5	4.0	不明			●					●					Ⅱ	2020
383	谷河内1号橋	市道谷河内1号線	2.8	4.3	不明		●					●						Ⅰ	2024
384	西の門前1号橋	市道西の門前線	2.4	8.6	不明		●					●						Ⅰ	2024
385	新屋敷通1号橋	市道新屋敷通線	2.0	14.1	不明	●					●							Ⅱ	2023
386	杭瀬1号橋	市道杭瀬線	2.8	5.3	不明			●					●					Ⅱ	2020
387	八河2号橋	市道八河線	2.5	3.1	不明			●					●					Ⅱ	2020
388	立山2号橋	市道立山線	2.4	4.4	不明			●					●					Ⅱ	2020
389	田淵2号橋	市道田淵線	2.4	2.8	不明		●					●						Ⅰ	2024
390	徳森団地10号橋	市道徳森団地15号線	2.3	4.0	不明	●	○				●					床版補修	6	Ⅱ	2023
391	四番池石田口1号橋	市道四番池石田口線	2.3	4.5	不明		●					●						Ⅰ	2024
392	横野松明1号橋	市道横野松明線	2.3	4.5	不明			●					●					Ⅱ	2020
393	大貨小蔵3号橋	市道大貨小蔵線	2.3	3.6	不明			●					●					Ⅱ	2020
394	板鶴崎2号橋	市道板鶴崎線	2.3	4.2	不明		●					●						Ⅰ	2024
395	立山1号橋	市道立山線	2.3	4.3	不明			●					●					Ⅱ	2020
396	八多喜田処3号橋	市道八多喜田処線	2.3	6.0	不明			●					●					Ⅱ	2020
397	田淵1号橋	市道田淵線	2.4	3.8	不明		●					●						Ⅰ	2024
398	馬くびり1号橋	市道馬くびり線	4.2	5.1	不明			●					●					Ⅱ	2020
399	河内休場1号橋	市道河内休場線	2.1	5.2	不明			●					●					Ⅱ	2020
400	上山辺2号橋	市道上山辺1号線	3.0	2.9	不明	●					●							Ⅱ	2023
401	上山辺1号橋	市道上山辺1号線	2.0	3.1	不明		●					●						Ⅱ	2024
402	上山辺3号橋	市道上山辺1号線	2.0	3.0	不明		●					●						Ⅰ	2024
403	中学校1号橋	市道中学校線	2.0	4.0	不明			●					●					Ⅱ	2020
404	幸田1号橋	市道幸田1号線	2.6	4.2	不明			●					●					Ⅱ	2020
405	中組1号橋	市道中組1号線	2.0	6.8	不明		●					●						Ⅰ	2024
406	恋木中道1号橋	市道恋木中道線	2.3	9.2	不明		●					●						Ⅰ	2024
407	上成橋	市道上老松大越線	4.5	6.5	不明			●					●					Ⅱ	2020
408	船木橋	市道出海浜保内線	4.6	3.0	不明			●	○				●			床版補修	12	Ⅲ	2020
409	尾仲3号橋	市道大本線	4.6	4.6	不明			●					●					Ⅱ	2020
410	櫻谷第一号橋	市道長浜戒川線	4.6	2.9	不明			●					●					Ⅱ	2020
411	都梅橋	市道都梅線	3.1	3.7	不明			●					●					Ⅱ	2020
412	旧鉢橋	市道出海線	4.5	4.3	不明			●					●					Ⅱ	2020
413	黒田橋	市道今坊築地2号線	4.5	4.3	不明			●			○		●			床版補修	8	Ⅱ	2020
414	第二横松郷橋	市道峰今坊線	4.5	4.0	不明			●	○				●			床版補修	10	Ⅲ	2020
415	松本橋	市道今坊松本線	4.3	4.7	不明			●					●					Ⅱ	2020
416	尾中橋	市道出海本線	4.3	4.2	不明			●					●					Ⅱ	2020

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検●・修繕○・更新□・撤去△・架設◎												補修内容	補修費用 (百万円)	直 近 判 定	最 新 点 検 年 度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
						R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14						
417	晴海1号橋	市道晴海1号線	5.0	7.0	不明			●					●					Ⅱ	2020		
418	晴海2号橋	市道晴海2号線	5.1	5.0	1972(推定)			●					●					Ⅱ	2020		
419	原保橋	市道原保線	4.2	7.5	不明			●					●					Ⅱ	2020		
420	須沢橋	市道須沢線	4.2	4.7	1929			●					●					Ⅱ	2020		
421	坂本2号橋	市道川端2号線	5.1	2.7	不明			●					●					Ⅱ	2020		
422	尾仲2号橋	市道音地線	4.1	4.9	不明			●					●					Ⅱ	2020		
423	大戸口橋	市道今坊松本線	4.1	3.5	不明			●	○				●			床版補修	8	Ⅲ	2020		
424	尾仲1号橋	市道海岸線	4.2	2.0	不明			●					●					Ⅰ	2020		
425	備前橋	市道備前磯上線	4.0	3.0	不明			●					●					Ⅱ	2020		
426	大成橋	市道須沢櫛生線	3.8	3.5	不明			●					●					Ⅱ	2020		
427	切迫橋	市道沖浦白木線	3.7	5.5	不明			●					●					Ⅱ	2020		
428	久保木橋	市道長浜戒川線	3.6	4.0	不明			●					●					Ⅱ	2020		
429	大戸橋	市道豆柳大戸線	4.2	3.3	不明			●	○				●			床版補修	8	Ⅲ	2020		
430	下谷上橋	市道郷谷上線	3.5	2.2	不明			●					●					Ⅰ	2020		
431	加納橋	市道須沢中央線	4.3	5.3	不明			●					●					Ⅱ	2020		
432	大谷橋	市道日ノ浦・大戸線	3.3	3.6	不明			●					●					Ⅱ	2020		
433	榎谷第二号橋	市道長浜・戒川線	3.2	3.6	不明			●					●					Ⅱ	2020		
434	大元橋	市道出海浜保内線	3.2	2.2	不明			●					●					Ⅱ	2020		
435	下平橋	市道下平環状線	3.1	19.5	不明			●					●					Ⅱ	2020		
436	青木谷橋	市道前奥線	3.5	1.2	2019			●					●					Ⅰ	2020		
437	萩ノクボ橋	市道須沢・櫛生線	3.6	2.4	不明			●					●					Ⅱ	2020		
438	加世橋	市道加世田ノ淵線	3.1	5.1	不明			●					●					Ⅱ	2020		
439	貝垣橋	市道日ノ浦・大戸線	3.3	4.6	不明			●					●					Ⅱ	2020		
440	丸井橋	市道松本支線	2.5	3.5	不明				●	○				●		床版補修	6	Ⅲ	2021		
441	本村橋	市道中央・平野線	2.4	2.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
442	橋立峰今坊1号橋	市道大谷口大戸線	2.3	5.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
443	高野橋	市道大平森線	5.7	6.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
444	北平橋	市道滝山奥小藪線	4.9	4.0	1969				●					●				Ⅱ	2021		
445	ガンゼキ橋	市道ガンゼキ竹の谷線	3.7	3.6	不明				●					●				Ⅱ	2021		
446	下嵯峨谷橋	市道鹿馬津下嵯峨谷線	4.0	4.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
447	中添谷橋	市道添谷橋添谷線	4.3	3.7	不明				●					●				Ⅱ	2021		
448	中小藪橋	市道小藪駄場・奥小藪線	3.2	5.3	不明				●					●				Ⅱ	2021		
449	山楡橋	市道赤岩下谷線	3.2	9.6	不明				●					●				Ⅱ	2021		
450	上小藪橋	市道奥小藪白石線	2.4	6.1	不明				●	○				●		断面修復	10	Ⅲ	2021		
451	谷尻橋	市道谷尻湧水線	2.4	3.5	不明				●					●				Ⅱ	2021		
452	不動橋	市道日の平大成線	4.8	6.8	不明				●					●				Ⅱ	2021		
453	長崎第三橋	市道一の瀬日其川線	4.3	4.0	不明				●					●				Ⅰ	2021		
454	長崎第二橋	市道一の瀬日其川線	4.2	5.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
455	日其川第二橋	市道一の瀬日其川線	4.1	3.3	不明				●					●				Ⅱ	2021		
456	坂本上橋	市道坂本中居線	3.2	6.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
457	かみふるがみ橋	市道古宮線	3.1	4.0	不明				●					●				Ⅱ	2021		
458	大中山第二橋	市道大中山名場連線	3.1	5.9	不明				●					●				Ⅱ	2021		
459	大中山第三橋	市道大中山名場連線	3.3	8.3	不明				●					●				Ⅱ	2021		
460	保井野橋	市道川上保井野線	2.2	2.8	不明				●					●				Ⅱ	2021		
461	久米川橋	市道大洲上須戒線	44.0	9.7	2007				●					●				Ⅰ	2021		
462	下山辺3号橋	市道下山辺7号線	3.9	8.1	不明			●					●					Ⅱ	2020		
463	下山辺4号橋	市道下山辺7号線	4.3	6.4	不明			●					●					Ⅱ	2020		
464	赤岩橋(歩道橋)	市道宇和川赤岩線	97.5	4.0	1965				●					●				Ⅱ	2021		
465	野田団地橋	市道香田野田団地線	15.1	1.7	不明		●	○					●			塗装塗替	18	Ⅰ	2024		
466	古宮橋	市道地藏堂1号線	3.6	4.7	1965		●			○			●			床版補修	8	Ⅰ	2024		
467	大洲久米2号橋	市道大洲久米線	8.0	9.4	2006			●					●					Ⅱ	2020		
468	向い橋	市道向い線	16.3	2.5	不明			●	○				●			床版補修	50	Ⅲ	2020		

対象施設毎の点検時期及び補修時期

(別表)

No.	道 路 橋 名	路 線 名	橋長 (m)	幅員 (m)	架設 年次 推定含	定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・架設[◎]										補修内容	補修費用 (百万円)	直近 判定	最新 点検 年度
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
469	小字根橋	市道小字根線	6.2	5.3	1994			●					●					I	2020
470	高嶋橋	市道小字根線	8.0	6.2	1997			●					●					I	2020
471	道野尾1号橋	市道鳥首道野尾線	5.7	5.7	1988				●					●				II	2021
472	新谷団地1号橋	市道新谷団地1号線	3.8	10.5	不明				●					●				II	2021
473	新谷団地2号橋	市道新谷団地2号線	3.8	6.6	不明				●					●				II	2021
474	橡の木橋	市道橡の木瀬線	7.0	4.5	1960					●					●			II	2022
475	弁天田野々1号橋	市道弁天田野々線	7.0	4.5	1995(推定)					●					●			II	2022
476	大成橋	市道大成橋線	198.7	8.2	2022	●					●							II	2023
477	無名橋	市道徳森団地21号線	6.0	6.0	1990	●					●							II	2023
478	平野1号橋	市道平野線	2.5	3.5	不明	●					●	○				床版補修	8	III	2023
479	新谷八多喜新町1号橋	市道新谷八多喜新町線	3.5	13.0	不明	●					●							II	2023
480	米津沖1号橋	市道米津沖線	3.8	3.0	不明	●					●							I	2023
481	無名橋	市道八多波線支線	8.3	5.6	不明	●					●							II	2023
482	無名橋	市道出海団地線	3.8	3.5	不明	●					●							I	2023
483	よのき3号橋	市道上老松・一ノ瀬線	3.5	6.2	2000	●					●							II	2023
484	上老松2号橋	市道上老松3号線	3.6	8.8	不明	●					●							II	2023
485	上老松3号橋	市道上老松7号線	4.6	2.9	不明	●					●							I	2023
486	壺神橋	市道長浜・戒川線	6.5	3.6	不明	●					●	○				桁・床版補修	15	III	2023
487	大屋敷橋	市道大屋敷口・高田線	11.9	3.5	1992	●					●							II	2023
488	日ノ平本谷1号橋	市道日ノ平本谷線	14.5	4.0	不明	●					●							II	2023
489	坂本5号橋	市道川端2号線	12.5	3.0	2007	●					●							II	2023
490	平地慶雲寺3号1号橋	市道平地慶雲寺3号線	2.9	8.7	不明			●			□		●			更新		III	2025
						114 20	89 5	99 6	81 9	107 13	112 11	90 11	99 9	80 10	107 9				
点検費用(百万円)						31	34	45	60	50	50	50	50	50	50				
設計費用(百万円)						7	8	29	15	10	10	10	10	10	10				
修繕費用(百万円)						148	54	58	42	64	72	90	85	89	71				
